



## Оновлений план реалізації медичної реформи

15 листопада 2017

# Плани щодо реалізації медичної реформи уточнено відповідно до реальних строків прийняття законодавства

**01** Планувалося на початку Реформи

**02** Плани уточнено після прийняття законів

☐ Набрання чинності законами

**1 липня 2017**

**1 січня 2018**

☐ Старт приписної кампанії (укладення декларацій про вибір сімейного лікаря),  
Створення НСЗУ

**2017**

**1 квітня 2018**

☐ Фінансування первинної медичної допомоги через НСЗУ

**1 січня 2018**

**1 липня 2018**

☐ Перехід всіх рівнів медичних послуг на нові правила

**Поступовий перехід з 2019**

**2020 — всі медичні послуги фінансуються за програмою медичних гарантій**

# Система охорони здоров'я у 2018

НСЗУ

**ФОП можуть перейти на фінансування від НСЗУ без обмежень**

**Комунальні заклади охорони здоров'я можуть перейти на фінансування від НСЗУ:**

- Тільки наприкінці кварталу (три «вікна можливостей»)
- Всі (ЗОЗ району / міста) або ніхто



- Відмова від паперового документообігу
- Збільшена сума фінансування
- Більше самостійності в прийнятті рішень
- Можливість збільшення зарплати лікаря



- Підвищена якість обслуговування
- Безкоштовне надання ліків за Програмою
- Пацієнт сам обирає, де обслуговуватись і лікаря
- Широкі можливості контролю сервісу з боку пацієнта
- Ніяких хабарів

01.01.2018

Набули чинності  
Закони

01.04.2018

Старт  
приписної кампанії

01.07.2018

Старт підписання  
договорів з НСЗУ

01.10.2018

Друге «вікно можливостей  
для підписання договору

31.12.2018

Остання можливість  
підписати договір у 2018



Субвенція



- Паперовий документообіг
- Сума фінансування як у 2017 році
- Фінансування за субвенцією до 01.07.2018



- Ліки необхідно купувати
- Обслуговування за пропискою та / або
- Необхідність доплачувати за послуги неофіційно зі своєї кишені

**Що потрібно зробити для всіх комунальних ЗОЗ у своєму місті / районі:**

- Провести автономізацію
- Забезпечити комп'ютеризацію та належне програмне забезпечення для використання eHealth, отримати ЕЦП ЗОЗ та лікарів ПМД
- Привести ЗОЗ у відповідність до табелів матеріально-технічного оснащення
- Забезпечити наявність чергового кабінету ПМД
- Застосування ІСРС-2
- Укласти декларації про вибір лікаря ПМД
- Укласти договір з НСЗУ

# Дорожня карта створення та розвитку НСЗУ

## Сформовано концепцію створення НСЗУ:

- ❑ Концепція розподілу функцій НСЗУ / eHealth / МОЗ
- ❑ Перелік цільових бізнес-процесів

## Закони щодо Реформи набули чинності

- Підготовчі заходи до старту Реформи:
- ❑ Автономізація ЗОЗ
  - ❑ Придбання обладнання й навчання працівників ЗОЗ

- ❑ Завершено подачу заяв кандидатів на конкурс
- ❑ Іде прийняття й погодження ключових нормативно-правових актів
- ❑ Внесені зміни щодо електронного медичного документообігу

- ❑ Оголошено результати конкурсу на посаду Голови НСЗУ
- ❑ Набрали чинності Постанови КМУ про порядок функціонування eHealth та укладення договорів ПМД
- ❑ ЗОЗ можуть готувати проекти договорів ПМД в Системі

- ❑ Офіційний запуск НСЗУ
- ❑ Розпочато підписання договорів ПМД та фінансування за новою схемою (капітація)
- ❑ Електронний документообіг для надавачів, які працюють з НСЗУ

15.11.2017

01.01.2018

01.03.2018

01.05.2018

01.07.2018



01.12.2017

01.02.2018

01.04.2018

01.06.2018

з 01.07.2018

## Офіційне оприлюднення законів з реформи; готова методологічна база фінансування ПМД:

- ❑ Бізнес-процеси, реєстри, словники
- ❑ Електронна медична документація
- ❑ Проекти НПА щодо створення та функціонування НСЗУ

- ❑ Постанова про утворення НСЗУ прийнята Кабміном
- ❑ Оголошений конкурс на заміщення посади Голови НСЗУ

- ❑ Положення про НСЗУ затверджене КМУ
- ❑ Завершено розробку першочергового функціоналу eHealth
- ❑ Розпочато процес підписання декларацій та підготовки проектів договорів про надання ПМД в системі eHealth

- ❑ Розпорядження КМУ про призначення Голови НСЗУ
- ❑ НСЗУ готова до запуску
- ❑ Розпочато набір персоналу

## Підготовка до старту другого етапу Реформи:

- ❑ Вторинна, третинна та ін. допомога
- ❑ Зміни до суміжних процесів, перехід до цільових процесів фінансування та надання медичних послуг

# Ключові компоненти Реформи: що потрібно зробити

## Комунальні ЗОЗ всього району/міста

- Автономізація
- Виконання стандарту технічного оснащення
- Комп'ютеризація та встановлення ПЗ для роботи з eHealth
- Укладання декларацій про вибір лікаря ПМД
- Навчання працівників роботі з eHealth

## Національна служба здоров'я України


- Визначити цільові функції Служби
- Розробити організаційну структуру
- Розробити та затвердити цільові бізнес процеси
- Розробити посадові інструкції
- Найняти персонал для забезпечення роботи Служби

## Парламент і Уряд України

- Погодити та прийняти нормативно-правові акти, що забезпечать функціонування цільової системи охорони здоров'я.
- Критично важливим є дотримання запланованих законодавчих строків погодження та затвердження НПА
- Забезпечення набрання чинності всіма потрібними законами до 1 січня 2018 року
- Призначити Голову НСЗУ

## eHealth

- Розробити функціонал та ІТ систему, необхідний для старту Реформи (укладення декларацій про вибір лікаря ПМД, договорів з НСЗУ, електронна медична документація, проведення розрахунків за ПМД)
- Провести тестування системи (у тому числі – під навантаженням) та отримати погодження КСЗІ

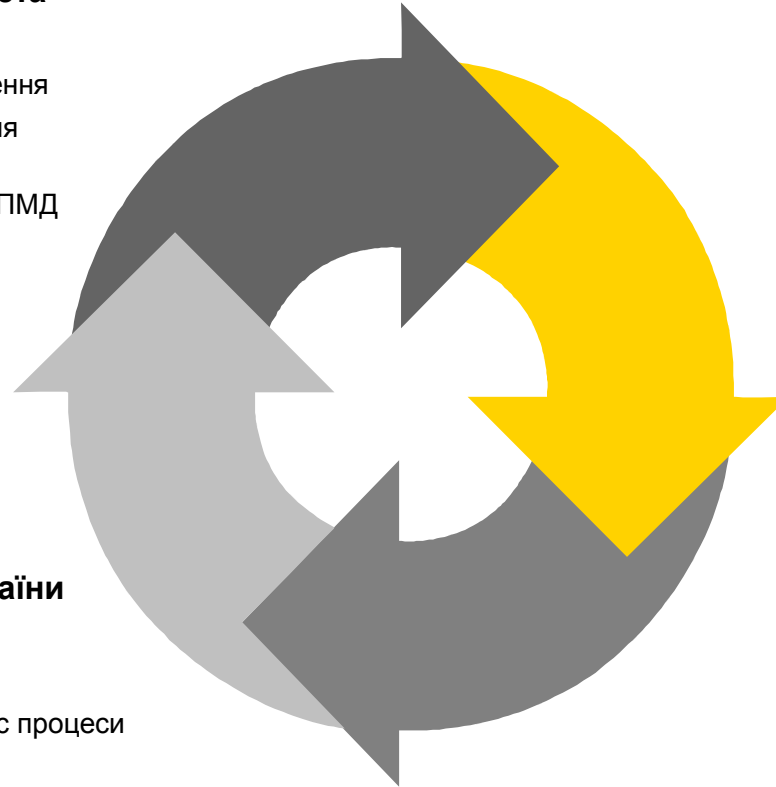




# 1 Національна служба здоров'я

## Детальний план

	Листопад 17	Грудень 17	Січень 18	Лютий 18	Березень 18	Квітень 18	Травень 18	Червень 18	Липень 18
<input type="checkbox"/> Проект організаційної структури									
<input type="checkbox"/> Ключові процеси, необхідні до запуску ПМД: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Укладення декларацій та договорів</li> <li>• Розрахунок сум фінансування</li> <li>• Ведення електронної медичної документації</li> </ul>									
<input type="checkbox"/> Погодження та прийняття Положення про НСЗУ									
<input type="checkbox"/> Призначення Голови НСЗУ (із урахуванням конкурсу)									
<input type="checkbox"/> Реєстрація НСЗУ									
<input type="checkbox"/> Цільова організаційна структура та посадові інструкції									
<input type="checkbox"/> Повний набір цільових бізнес-процесів Служби									
<input type="checkbox"/> Набір персоналу до НСЗУ									
<input type="checkbox"/> Старт первинної медичної допомоги у новому форматі									
<input type="checkbox"/> Розробка дорожньої карти другого етапу Реформи (до 2020 року)									

### 3 Система eHealth

#### Детальний план

	Листопад 17	Грудень 17	Січень 18	Лютий 18	Березень 18	Квітень 18	Травень 18	Червень 18	Липень 18
<input type="checkbox"/> Постановка задачі щодо першочергового функціоналу системи <ul style="list-style-type: none"> <li>• Укладення декларацій та договорів</li> <li>• Розрахунок сум фінансування</li> <li>• Ведення електронної медичної документації</li> <li>• Ключові реєстри</li> </ul>									
<input type="checkbox"/> Погодження КСЗІ для системи eHealth									
<input type="checkbox"/> Розробка першочергового функціоналу Системи									
<input type="checkbox"/> Тестування системи, включаючи тестування під навантаженням									
<input type="checkbox"/> Старт підписання декларацій вибору лікаря ПМД в Системі									
<input type="checkbox"/> Старт підготовки проектів договорів на надання ПМД в Системі									
<input type="checkbox"/> Старт обліку ПМД в електронній системі, відмова від паперового документообігу									
<input type="checkbox"/> Старт розробки концепції автоматизації для другого етапу Реформи (до 2020 року)									

## 2 Підготовка закладів охорони здоров'я всього району / міста

### Детальний план

	Листопад 17	Грудень 17	Січень 18	Лютий 18	Березень 18	Квітень 18	Травень 18	Червень 18	Липень 18
<input type="checkbox"/> Прийняття та погодження нормативно-правових актів щодо автономізації									
<input type="checkbox"/> Автономізація комунальних ЗОЗ всього району чи міста (тільки якщо весь район автономізується можна буде отримати фінансування за договорами про медичне обслуговування з НСЗУ)									
<input type="checkbox"/> Приведення ЗОЗ у відповідність до стандартів технічного оснащення: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Медичне обладнання та приміщення відповідно до табелів оснащення</li> <li>• Комп'ютеризація та програмне забезпечення для доступу до eHealth, автоматизовані робочі місця лікарів</li> <li>• Отримання ЕЦП ЗОЗ та ЕЦП лікаря з ПМД</li> <li>• Навчання працівників роботі в eHealth</li> </ul>									
<input type="checkbox"/> «Приписна кампанія» (укладення декларацій вибору лікаря ПМД) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведення роз'яснювальної роботи серед пацієнтів</li> <li>• Допомога пацієнтам обрати лікаря і укласти декларацію в електронній формі</li> </ul>									
<input type="checkbox"/> Укладення договору про медичне обслуговування населення з НСЗУ									



# Ключові ризики та шляхи їх зниження

Ризик	Опис ризику	Шляхи подолання / зниження
Відсутність законних підстав для Реформи	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Закон № 6327 досі не підписаний Головою ВР, Президентом та не оприлюднений</li> <li>❑ Законопроект № 6604 не прийнятий у другому читанні</li> <li>❑ Законопроект № 7000 потребує змін</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Забезпечення тісної взаємодії, швидкого реагування та взаємоузгоджених дій усіх заінтересованих осіб</li> <li>❑ Підтримка Уряду</li> </ul>
Відсутність підзаконних НПА для Реформи	Можливий опір заінтересованих органів у погодженні НПА, необхідних для старту Реформи (НСЗУ, eHealth, електронний медичний документообіг)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Забезпечення тісної взаємодії, швидкого реагування та взаємоузгоджених дій усіх заінтересованих осіб</li> <li>❑ Підтримка Уряду</li> </ul>
Відсутність погодження КСЗІ на eHealth	eHealth не використовуватись НСЗУ без погодження КСЗІ	Підтримка Уряду
НСЗУ платитиме за «мертві душі»	Відсутність змін в Законах для автоматичного обміну eHealth з державними Реєстрами	Підтримати та внести до Верховної Ради законопроект про внесення змін до законів для функціонування eHealth (доступ до реєстрів)
Труднощі використання системи eHealth закладами на початковому етапі	Пацієнтам потрібна буде допомога працівника ЗОЗ під час укладення декларації в Системі eHealth	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Провести навчання працівників ЗОЗ</li> <li>❑ Забезпечити наявність ПЗ для роботи з eHealth</li> </ul>

# Додатки



# Плани щодо реалізації медичної реформи уточнено відповідно до реальних строків прийняття законодавства (1/2)

	Січень 2018	Лютий 2018	Березень 2018	Квітень 2018	Травень 2018
<input type="checkbox"/> Постанова про Утворення НСЗУ	Погодження	Прийняття			
<input type="checkbox"/> Порядок використання коштів бюджетної програми НСЗУ на ПМД та порядок використання медичної субвенції на 2018 рік	Погодження	Прийняття			
<input type="checkbox"/> Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування на рівні ПМД на 2018-2019 роки	Погодження	Прийняття			
<input type="checkbox"/> Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника ЗОЗ, порядок укладання контракту з керівником та також типова форма контракту	Погодження	Прийняття			
<input type="checkbox"/> Розпорядження про призначення Голови НСЗУ		Оголошення та проведення конкурсу на посаду Голови НСЗУ			Призначення Голови НСЗУ
<input type="checkbox"/> Положення про НСЗУ	Погодження		Прийняття		
<input type="checkbox"/> Положення про Раду громадського контролю НСЗУ та порядок проведення конкурсу на її формування	Погодження		Прийняття	Затвердження персонального складу Ради громадського контролю НСЗУ	
<input type="checkbox"/> Порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я (eHealth)	Погодження, в тому числі експертиза КСЗІ		Прийняття, погоджена КСЗІ		
<input type="checkbox"/> Порядок укладення договорів про медичне обслуговування, типовий договір для ПМД	Погодження		Прийняття		

## Плани щодо реалізації медичної реформи уточнено відповідно до реальних строків прийняття законодавства (2/2)

	Січень 2018	Лютий 2018	Березень 2018
<input type="checkbox"/> Зміни до наказів МОЗ стосовно електронного медичного документообігу	Погодження	Прийняття	Реєстрація у Мін'юсті (15 робочих днів)
<input type="checkbox"/> Порядок надання ПМД	Погодження	Прийняття	Реєстрація у Мін'юсті (15 робочих днів)
<input type="checkbox"/> Порядок вибору лікаря, який надає ПМД і затвердження декларації про вибір лікаря, який надає ПМД	Погодження		Прийняття, Реєстрація у Мін'юсті (15 робочих днів)
<input type="checkbox"/> Порядок складення програми медичних гарантій, критерії відбору медичних послуг	Погодження, в т.ч. з Мінфіном	Прийняття	Реєстрація у Мін'юсті (15 робочих днів)
<input type="checkbox"/> Методика розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів	Погодження, в т.ч. з Мінфіном	Прийняття	Реєстрація у Мін'юсті (15 робочих днів)
<input type="checkbox"/> Методичні рекомендації з питань перетворення ЗОЗ з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства	Погодження	Прийняття	
<input type="checkbox"/> Примірне положення про Опікунську раду ЗОЗ	Погодження	Прийняття	

# Необхідна підтримка з боку Уряду

---

- ▶ Сприяти прийняттю, підписанню та оприлюдненню Законів з Реформи
- ▶ Максимально сприяти погодженню / прийняттю нормативно-правових актів Кабміном та міністерствами / службами:
  - ❑ Постанов КМУ (з питань НСЗУ, eHealth, автономізації та питань використання бюджетних коштів за програмою та субвенціями)
  - ❑ Наказів МОЗ і Мінфіну
  - ❑ КСЗІ для Системи eHealth (не пізніше березня 2018)
- ▶ Підтримати та внести до Верховної Ради законопроект про внесення змін до законів для функціонування eHealth (доступ до реєстрів) та інші технічні зміни для безперешкодної роботи НСЗУ та надавачів
- ▶ Підтримати процес проведення конкурсу та призначення Голови НСЗУ
